



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
VERTENTES, 22 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	58,30	28,66	0,25	-	0,25	1.670,88	14,58	-	14,58
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,96	91,89	-	-	-	639,55	-	-	-
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,69	59,58	-	-	-	458,17	-	-	-
1.4	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,67	32,00	-	-	-	149,44	-	-	-
1.5	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021	M3	87,42	18,00	4,41	-	4,41	1.573,56	385,52	-	385,52
2.0	ESTRUTURA										
2.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.313,50	0,45	-	-	-	1.041,08	-	-	-
2.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA	M2	222,30	6,21	8,40	-	8,40	1.380,48	1.867,32	-	1.867,32
3.0	ALVENARIA PAREDES										
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.	M2	90,09	48,00	65,77	2,64	68,41	4.324,32	5.925,22	237,84	6.163,06
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ.	M2	71,23	261,21	182,60	-	182,60	18.605,99	13.006,60	-	13.006,60
4.0	CALHA										
4.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	175,76	32,00	32,00	-	32,00	5.624,32	5.624,32	-	5.624,32

Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23
11:39:20 -03'00"

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.776-000 | Centro | Vertentes-PE

gabinete@vertentes.pe.gov.br

81 99814-4011
81 9500-0189

CNPJ
10.256.887/0001-60

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE - 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
VERTENTES, 22 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 043/2025 - PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	251,58	4,00	4,00	-	4,00	1.006,32	1.006,32	-	1.006,32
5.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	270,05	8,00	8,00	-	8,00	2.160,40	2.160,40	-	2.160,40
5.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	344,89	4,00	4,00	-	4,00	1.379,56	1.379,56	-	1.379,56
5.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,53	8,00	8,00	-	8,00	156,24	156,24	-	156,24
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES										
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	4,74	456,54	505,39	2,64	508,03	2.164,00	2.395,55	12,51	2.408,06
6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	41,97	457,14	505,39	2,64	508,03	19.186,17	21.211,22	110,80	21.322,02
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	66,79	59,58	-	-	-	3.979,35	-	-	-
7.0	PINTURA										
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,49	1.101,86	-	1.101,86	1.101,86	4.947,35	-	4.947,35	4.947,35
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,62	1.101,86	-	1.101,86	1.101,86	11.701,75	-	11.701,75	11.701,75

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:071141344
Assinado de forma digital por TYSON CIPRIANO DA SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23 11:39:41 -03'00'

81 98814-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urban. e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
VERTENTES, 22 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
8.0	REVESTIMENTO DE PISO										
8.1	LASTRO DE PISO COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO.	M2	43,28	25,67	6,00	-	6,00	1.111,00	259,68	-	259,68
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	35,45	25,67	18,45	-	18,45	910,00	654,05	-	654,05
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	61,67	25,67	-	-	-	1.583,07	-	-	-
9.0	PORTAS										
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1.134,20	5,00	1,00	-	1,00	5.671,00	1.134,20	-	1.134,20
10.0	PORTÕES, GRADES E TELAS										
10.1	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"x1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	454,29	25,00	-	20,00	20,00	11.357,25	-	9.085,80	9.085,80
10.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	178,13	50,00	-	90,60	90,60	8.906,50	-	16.138,58	16.138,58
10.3	COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2 1/2"	M2	29,95	240,00	240,00	-	240,00	7.188,00	7.188,00	-	7.188,00

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:071141344
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23
11:39:54 -03'00'

CNPJ 10.296.887/0001-60 81 99814-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gertúlio Timóteo Bezeiro
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
VERTENTES, 22 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.0	LOUÇAS SANITÁRIAS										
11.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	362,16	4,00	-	4,00	4,00	1.448,64	-	1.448,64	1.448,64
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	181,39	2,00	-	2,00	2,00	362,78	-	362,78	362,78
Valor do Boletim: QUARENTA E QUATRO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS								120.687,17	64.368,78	44.046,05	108.414,83

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23
11:40:05 -03'00'

Gertúlio Fimoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 10.250.857/0001-90 81 99814-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emídio Cavalcanti, nº 87 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



MEMÓRIA DE CALCULO					BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04					
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES										
LOCAL: MARGENS DA PE-090, VERTENTES-PE.										
CONTRATO Nº 043/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025 - DISPENSA Nº 012/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº VERTENTES, 22 DE ABRIL DE 2025.										
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
3.0	ALVENARIA PAREDES									
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.				M2					
						1,70		0,60	2,00	2,04
						0,50		0,60	2,00	0,60
									TOTAL:	2,64
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES									
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 10/2022				M2					
						1,70		0,60	2,00	2,04
						0,50		0,60	2,00	0,60
									TOTAL:	2,64
6.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024				M2					
						1,70		0,60	2,00	2,04
						0,50		0,60	2,00	0,60
									TOTAL:	2,64
7.0	PINTURA									
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023				M2					
	BANHEIRO FEMININO					1,34		0,77	2,00	2,06
	BANHEIRO FEMININO					4,57		0,77		3,52
	BANHEIRO FEMININO					1,00		0,77		0,77

Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23 11:40:32

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:07114134444

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

gabinete@vertentes.pe.gov.br

81 99814-4011
81 9500-0189

10.296.887/0001-60

CNPJ

81 99814-4011
81 9500-0189

10.296.887/0001-60

CNPJ

10.296.887/0001-60

Gertulio Japeteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE

CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CBO 21.201.01

	BANHEIRO FEMININO		1,60		0,77		1,23
	BANHEIRO FEMININO		1,52		0,77		1,17
	BANHEIRO FEMININO		1,37		0,77	5,00	5,27
	BANHEIRO MASCULINO		4,60		0,77	2,00	7,08
	BANHEIRO MASCULINO		2,89		0,77	2,00	4,45
	BANHEIRO MASCULINO		0,96		0,77		0,74
	BANHEIRO MASCULINO		1,30		0,77	6,00	6,01
	MURO		85,65		3,00	2,00	513,90
	MURO		86,35		2,50		215,88
	MURO		86,35		3,00		259,05
	MURO		40,00		2,00		80,00
	MURO		6,10		0,12		0,73
	MURO						
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	M2				TOTAL:	1.101,86
	BANHEIRO FEMININO		1,34		0,77	2,00	2,06
	BANHEIRO FEMININO		4,57		0,77		3,52
	BANHEIRO FEMININO		1,00		0,77		0,77
	BANHEIRO FEMININO		1,60		0,77		1,23
	BANHEIRO FEMININO		1,52		0,77		1,17
	BANHEIRO FEMININO		1,37		0,77	5,00	5,27
	BANHEIRO MASCULINO		4,60		0,77	2,00	7,08
	BANHEIRO MASCULINO		2,89		0,77	2,00	4,45
	BANHEIRO MASCULINO		0,96		0,77		0,74
	BANHEIRO MASCULINO		1,30		0,77	6,00	6,01
	MURO		85,65		3,00	2,00	513,90
	MURO		86,35		2,50		215,88
	MURO		86,35		3,00		259,05
	MURO		40,00		2,00		80,00

Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Dados: 2025.04.23
11:40:44 -03'00'

TYSON CIPRIANO

DA

SILVA:0711413444

4

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

gabinete@vertentes.pe.gov.br

81 99814-4011
81 9500-0189

CNPJ
10.296.387/0001-60

Gerúlio Tinoteo Bezerra

Sec. de Desenvolvimento

Urbanismo e Transportes-PE

CPF: 088.935.284-284

Portaria Nº: 091/2025

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil

	MARQUIZE		6,10	0,12		0,73
10.0	PORTÕES, GRADES E TELAS				TOTAL:	1.101,86
10.1	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2				
			5,00	4,00		20,00
					TOTAL:	20,00
10.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2				
			20,00	4,00		80,00
			1,40	4,00		5,60
			5,00	1,00		5,00
					TOTAL:	90,60
11.0	LOUÇAS SANITÁRIAS					
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND				
					4,00	4,00
					TOTAL:	4,00
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND				
					2,00	2,00
					TOTAL:	2,00

Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23
11:40:54 -03'00'

TYSON CIPRIANO
Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 09/1/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Contrato: 043/2025

Local: Vertentes-PE

Medição: 04

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 22/04/2025



Gertulio Tinotéo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907942-1

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Contrato: 043/2025

Local: Vertentes-PE

Medição: 04

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 22/04/2025



Gertúlio Lindeiro Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 086.986.264-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907/2024

296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

 gabinete@vertentes.pe.gov.br

 Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES


Contrato: 043/2025

Local: Vertentes-PE

Medição: 04

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 22/04/2025

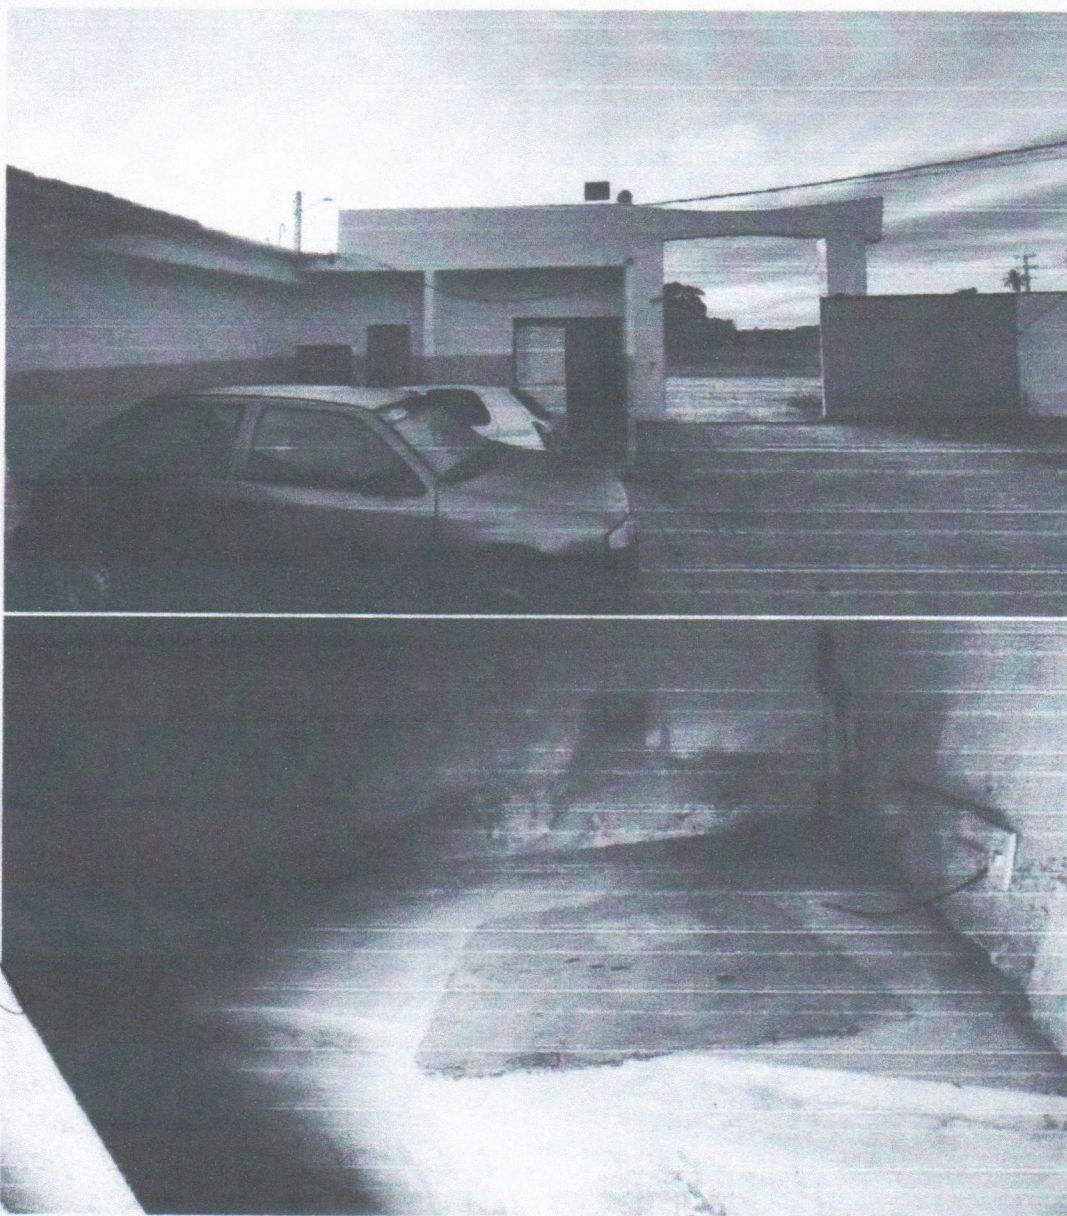

Gertúlio Tinoco Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 086.366.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
C.R.E. PE 181607/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Contrato: 043/2025

Local: Vertentes-PE

Medição: 04

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 22/04/2025




Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907382-1

TYSON CIPRIANO Assinado de forma digital
DA por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Dados: 2025.04.23
11:42:00 -03'00'

44

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES


Contrato: 043/2025

Local: Vertentes-PE

Medição: 04

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 22/04/2025

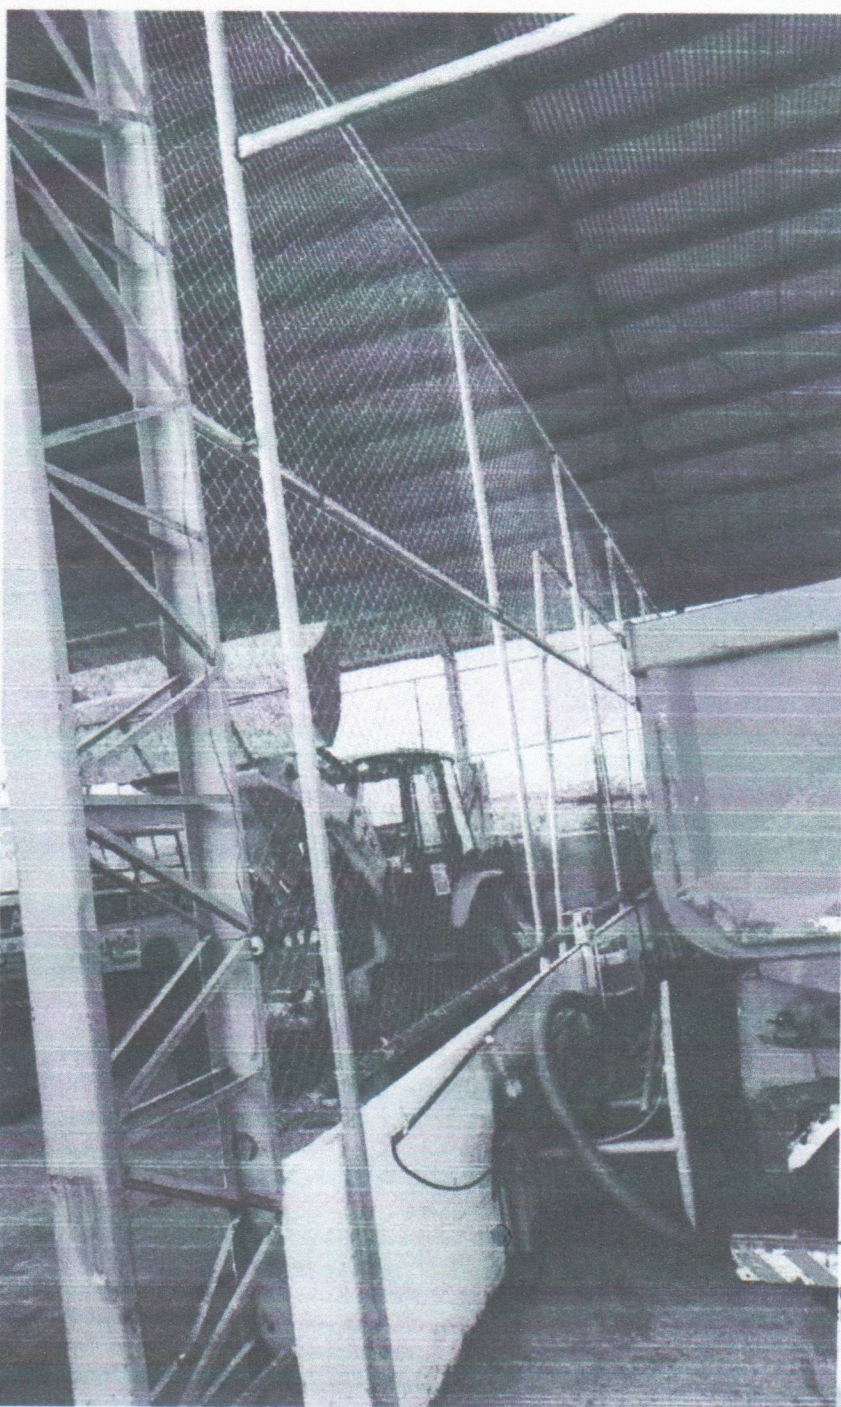

Gertúlio Tineteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.264-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1

CNPJ
10.296.887

**TYSON
CIPRIANO DA
SILVA:07114
134444**

Assinado de forma
digital por TYSON
CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23
11:42:11 -03'00'

r. Emídio Cavalcanti, n° 97
EP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES


Contrato: 043/2025


Local: Vertentes-PE


Medição: 04

Contratada: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ:
47.972.147/0001-07

Data: 22/04/2025

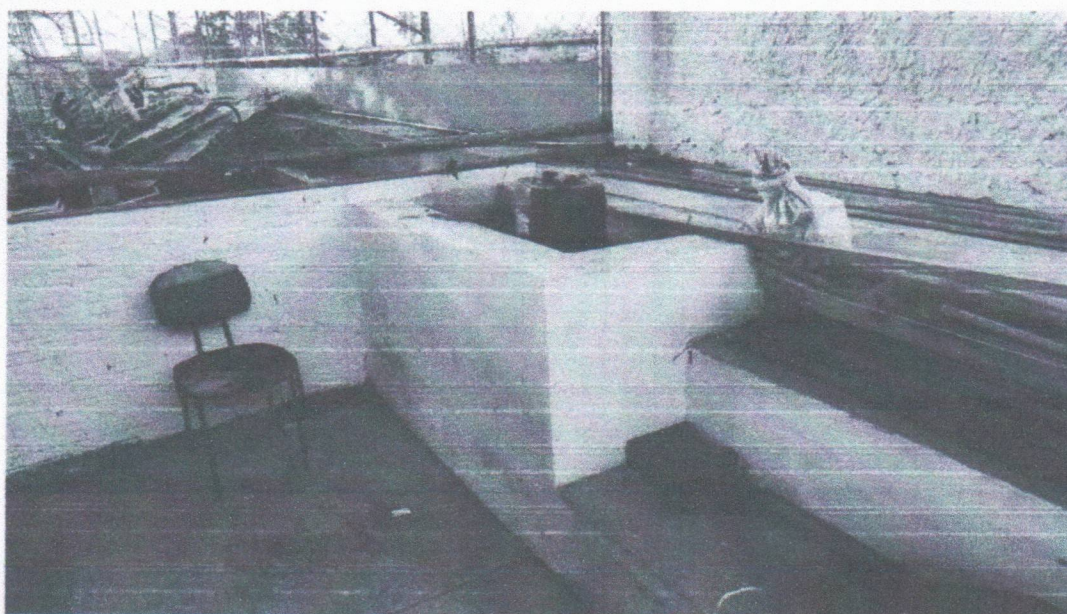


Gerônimo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N.º 091/2024


Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181907982-1

TYSON
CIPRIANO DA
SILVA:07114134
444

Assinado de forma
digital por TYSON
CIPRIANO DA
SILVA:07114134444
Dados: 2025.04.23
11:42:19 -03'00'
