

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

VERTENTES, 25 DE ABRIL DE 2026.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05
LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM.	
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO		
1	PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DIREITO (JAU ARNOBIS)										
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	113,00	103,73		358,21	328,82	-	328,82	
1.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	192,00	192,00		14.759,04	14.759,04	-	14.759,04	
1.2	ALVENARIA										
1.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 08/2022	m³	471,98	194,00	172,65		91.564,12	81.487,34	-	81.487,34	
1.3	TUBOS										
1.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 03/2024	M	104,04	56,00	56,00		5.826,24	5.826,24	-	5.826,24	
1.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	82,71	300,00	300,00		24.813,00	24.813,00	-	24.813,00	
1.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	46,84	10,00			468,40		-		
2	PASSAGEM MOLHADA LIVRAMENTO - RIACHO TOPADA (GONCALVES)										
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Planejamento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 10.296.887/0001-60
81 99814-4081
81 9500-0185
gabinete@vertentes.pe.gov.br
Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CPF 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
VERTENTES, 25 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05
LOCAL: RIACHO DIREITO RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM.	
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3.17	51.00	-	-	161.67	-	-	-	-
2.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76.87	60.00	-	-	4.612.20	-	-	-	-
2.2	ALVENARIA										
2.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 06/2022	m³	471.98	94.50	-	-	44.602.11	-	-	-	-
2.3	TUBOS										
2.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 03/2024	M	56.20	40.00	-	-	2.248.00	-	-	-	-
2.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
2.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	82.71	225.00	-	-	18.609.75	-	-	-	-
2.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	46.84	9.00	-	-	421.56	-	-	-	-
2.5	SINALIZAÇÃO										
2.5.1	CONFECÇÃO DE PILARETE PARA SINALIZAÇÃO COM TUBOS DE PVC DE 150MM PREENCHIDO COM CONCRETO DE 15MPa	M	78.93	20.00	-	-	1.578.60	-	-	-	-
3	PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DIREITO (ZE DE JOTA)										
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										

HPS - CONSTRUTORA
Sociedade Limitada
Sociedade Administradora
CNPJ - 113.608.024-44

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Planejamento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 09/1/2024

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CPF 55.779-000 | Control | Vertentes-PE
gabinete@vertentes.pe.gov.br
81 98814-4011
81 9500-0189



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05

VERTENTES, 25 DE ABRIL DE 2025.

LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m²	3,17	53,58	30,14	-	30,14	169,84	95,54	-	95,54
3.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL).	m³	76,87	56,00	56,00	-	56,00	4.304,72	4.304,72	-	4.304,72
3.2	ALVENARIA										
3.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3:40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2022	m³	471,98	98,10	98,10	-	98,10	46.301,23	46.301,23	-	46.301,23
3.3	TUBOS										
3.3.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	291,76	12,00	12,00	-	12,00	3.501,12	3.501,12	-	3.501,12
3.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
3.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82,71	96,00	96,00	-	96,00	7.940,16	7.940,16	-	7.940,16
3.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46,84	6,00	-	-	-	281,04	-	-	-
4	PASSAGEM MOLHADA - ALTO DO FOGO										
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	19,20	-	-	-	50,86	-	-	-
4.2	ALVENARIA										

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05

VERTENTES, 26 DE ABRIL DE 2025.

LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ EM VERTENTES-PE.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 262/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

CONTRATO Nº 262/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
4.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2022	m³	471,98	32,70	-	-	-	15.433,74	-	-	-
4.3	TUBOS										
4.3.1	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	74,69	10,00	-	-	-	746,90	-	-	-
4.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
4.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82,71	90,00	-	-	-	7.443,90	-	-	-
4.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46,84	6,00	-	-	-	281,04	-	-	-
5	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO JUCURI										
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	72,00	-	67,50	67,50	228,24	-	213,98	213,98
5.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	72,00	-	72,00	72,00	5.534,64	-	5.534,64	5.534,64
5.2	ALVENARIA										
5.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471,98	51,00	-	51,00	51,00	24.070,98	-	24.070,98	24.070,98
5.3	TUBOS										

Gertulio Amoteco Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 051/2024

81 99814-4011
81 9550-0189
gabinete@vertentes.pe.gov.br
Dr. Enidio Cavalcanti, nº 97
CIP 55.770-COO | Centro | Vertentes-PE

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Gênia Administradora
CPF - 113.605.004-44

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
VERTENTES, 25 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05
LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			ACUM.	
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	
5.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	104,04	24,00	-	-	-	2.496,96	-	-	-
6	PASSAGEM MOLHADA - RIACHO DIREITO (ZE SOBRINHO)										
6.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
6.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3,17	74,40	73,26	-	73,26	235,84	232,23	-	232,23
6.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	140,00	140,00	-	140,00	10.761,80	10.761,80	-	10.761,80
6.2	ALVENARIA										
6.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 08/2022	m³	471,98	136,80	130,79	-	130,79	64.566,86	61.732,15	-	61.732,15
6.3	TUBOS										
6.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	104,04	40,00	40,00	-	40,00	4.161,60	4.161,60	-	4.161,60
6.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
6.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	82,71	300,00	315,00	-	315,00	24.813,00	26.053,65	-	26.053,65
6.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	46,84	10,00	-	-	-	468,40	-	-	-

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
CNPJ 10.286.687/0001-60
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Dr. Enidio Cavalcanti, nº 97
CEP 53.770-000 | Centro | Vertentes - PE
gabinete@vertentes.pe.gov.br

VERTENTES
UM NOVO TEMPO, NUNTO DO POVO

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05
LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

CONTRATO N° 232/2024 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRÊNCIA N° 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICÇÃO	ACUM.
7	PASSAGEM MOLHADA - PEDRA RAJADA										
7.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
7.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3.17	12.40	-	-	-	39.30	-	-	-
7.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0.20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.)	m³	76.87	150.00	-	-	-	11.530.50	-	-	-
7.2	ALVENARIA										
7.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3.40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2022	m³	471.98	37.28	-	-	-	17.595.41	-	-	-
7.3	TUBOS										
7.3.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_03/2024	M	104.04	24.00	-	-	-	2.496.96	-	-	-
7.4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
7.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	82.71	480.00	-	-	-	39.700.80	-	-	-
7.4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	46.64	12.00	-	-	-	562.08	-	-	-
8	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO JACU (ANTONIO CAETANO)										
8.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
8.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	3.17	32.00	-	-	-	101.44	-	-	-

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05

LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

VERTENTES, 25 DE ABRIL DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 0571/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
8.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³	76,87	150,00	-	-	-	11.530,50	-	-	-
8.2	ALVENARIA										
8.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 08/2022	m³	471,98	81,00	-	-	-	38.230,36	-	-	-
8.3	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO										
8.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	m²	82,71	300,00	-	-	-	24.813,00	-	-	-
8.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF 01/2024	M	45,84	40,00	-	-	-	1.873,60	-	-	-
								582.299,74	232.298,64	29.819,60	322.118,24
Valor do Boletim: VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS											

Gertúlio Timoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbanismo e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 001/2024

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.606.024-44

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES


CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ: 20.520.477/0001-05


LOCAL: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTITATIVO				
			COMP	LARG	ESP/ ALTURA	QUANT	TOTAL
5	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO JUCURI						
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO						
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	m³					
			37,50	1,00	1,00		37,50
			37,50	1,00	0,80		30,00
						TOTAL	67,50
5.1.2	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILO ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL)	m³					
			30,00	6,00	0,40		72,00
			18,00	6,00	0,40		43,20
			8,60	6,00	0,30		15,48
	TOTAL EXECUTADO						130,68
	CONTRATADO E MEDIDO NO BM 05						72,00
	TOTAL PARA ADITIVAR						58,68
5.2	ALVENARIA						
5.2.1	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 08/2022	m²					
	LARGURA MÉDIA 0,7		37,50	0,70	1,50		39,38
	LARGURA MÉDIA 0,7		37,50	0,70	1,70		44,63
			11,50	0,60	0,40		2,76
	MÃO FRANCESA (2,20*0,6*0,55)+(0,6*2,20/2)*0,55)			VOLUME	1,09	5,00	5,45
	CALÇADA		2,50	2,10	0,50	3,00	7,88
	CALÇADA		1,50	2,10	0,50	1,00	1,58
	TOTAL EXECUTADO						101,66
	CONTRATADO E MEDIDO NO BM 05						51,00
	TOTAL PARA ADITIVAR						50,66


Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1




Gerônimo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024


HPS - Construtora LTDA
Suelem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 06

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES A SABER: RIACHO DIREITO, RIACHO TOPADA, ALTO DO FOGO, SÍTIO JUCURI, PEDRA RAJADA E SÍTIO JACÚ, EM VERTENTES-PE.

CONTRATO Nº 252/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 057/2024 - CONCORRENCIA Nº 007/2024

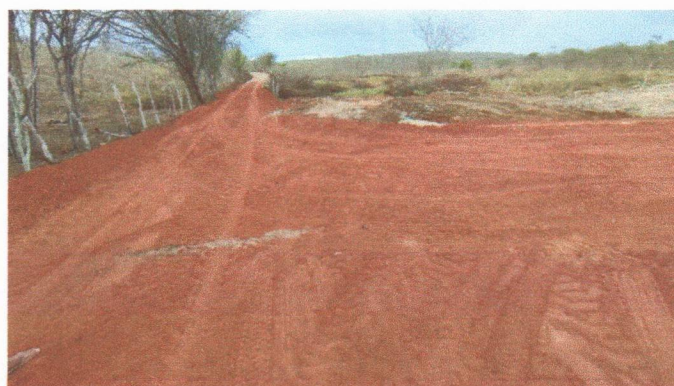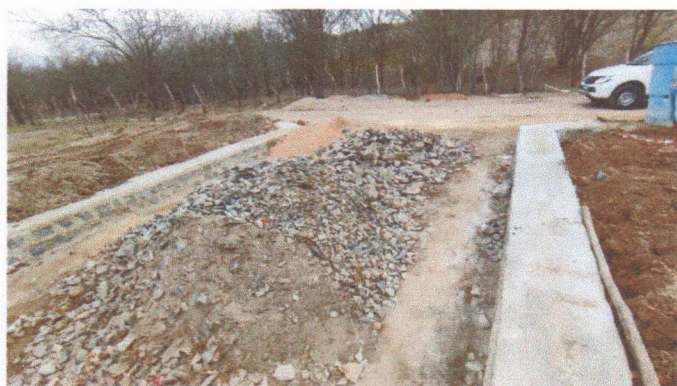


Gerulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024
