

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 12.920.437/0001-76

LOCAL: SERRA SECA - VERTENTES-PE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VELATORIO E AMPLIAÇÃO DO CEMTERIO SERRA SECA, MUNICIPIO DE VERTENTES-PE

CONTRATO Nº 165/2025

DATA DE ELABORAÇÃO: 30/09/2025

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
						PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM
4			CONSTRUÇÃO VELATORIO										
4			VELATORIO - CONSTRUÇÃO										
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	103,46	13,48		47,25	47,25	1.394,64	-	4.888,49	4.888,49
4.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF_01/2024	m²	22,40	14,25		7,04	7,04	319,20	-	157,70	157,70
4.3	11.01.02U	COMPESA	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ, (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	m³	108,27	22,98		72,85	72,85	2.488,04	-	7.887,47	7.887,47
4.4	11.01.01U	COMPESA	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1/2 VEZ, (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO).	m²	83,82	130,90		136,81	136,81	10.972,03	-	11.467,41	11.467,41
4.5	18.02.107	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FORMAS E LANÇAMENTO (M³)	M³	3.112,13	3,04		6,51	6,51	9.460,97	-	20.259,97	20.259,97
4.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	5,11	261,80		33,04	33,04	1.337,79	-	168,83	168,83
4.7	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E ≥ 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	29,34	261,80		33,04	33,04	7.581,21	-	969,39	969,39
4.8	104841	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	11,87	237,80			0,00	2.822,88	-	-	0,00
4.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	4,91	237,80			0,00	1.167,59	-	-	0,00
4.10	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020	m²	242,24	7,34		11,64	11,64	1.776,83	-	2.819,67	2.819,67
5			VELATORIO - ESQUADRIAS										
5.1	100686	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1.309,79	2,00			0,00	2.519,56	-	-	0,00
5.2	94571	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	870,31	2,40			0,00	2.088,74	-	-	0,00
5.3	12334	ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	533,16	3,15			0,00	1.579,45	-	-	0,00
6			VELATORIO - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
6.1	86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	670,44	2,00			0,00	1.340,88	-	-	0,00
6.2	86938	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	567,46	2,00			0,00	1.114,92	-	-	0,00
6.3	12030	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	un	103,88	4,00			0,00	415,52	-	-	0,00

GUSTAVO DE GUSTAVO DE
 ARAUJO ARAUJO
 LIMA:11626685
 2025-10-01
 479 23:23:51-0300

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

6.4	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	un	87,02	2,00		0,00	174,04	-	-	0,00
6.5	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	119,43	2,00		0,00	238,86	-	-	0,00
6.6	C2632	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	5.283,11	1,00		0,00	5.283,11	-	-	0,00
6.7	34637	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPAA	UN	298,38	1,00		0,00	298,38	-	-	0,00
7			VELATÓRIO - MESA PARA VELATÓRIO									
7.1	11.01.02U	COMPESA	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO)	m²	108,27	3,20		0,00	346,46	-	-	0,00
7.2	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,11	6,40		0,00	32,70	-	-	0,00
7.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	29,34	6,40		0,00	187,77	-	-	0,00
7.4	18.02.107	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FORMAS E LANÇAMENTO (M³)	M³	3.112,13	0,32		0,00	995,88	-	-	0,00
7.5	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	96,87	11,36		0,00	1.100,44	-	-	0,00
8			VELATÓRIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
8.1	101978	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	124,11	1,00		0,00	124,11	-	-	0,00
8.2	841	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	279,84	15,00		0,00	4.197,60	-	-	0,00
8.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc de atarramento	pt	264,55	10,00		0,00	2.645,50	-	-	0,00
8.4	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	8,81	5,00		0,00	44,05	-	-	0,00
8.5	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	14,89	10,00		0,00	148,90	-	-	0,00
8.6	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	220,17	8,00		0,00	1.761,36	-	-	0,00
8.7	105542	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	186,73	2,00		0,00	393,46	-	-	0,00
8.8	93682	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	81,67	5,00		0,00	408,35	-	-	0,00
8.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,24	300,00		0,00	1.572,00	-	-	0,00
9			VELATÓRIO - FRENTE/PISO									
9.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	22,40	75,95		0,00	1.701,28	-	-	0,00
9.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	60,99	79,95		0,00	4.876,15	-	-	0,00
9.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	m²	100,82	75,95		0,00	7.657,27	-	-	0,00
9.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	111,23	41,40		0,00	4.604,92	-	-	0,00
10			VELATÓRIO - COBERTA									
10.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	59,15	54,25		0,00	3.208,88	-	-	0,00
10.2	C4468	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	209,99	75,95		0,00	15.948,74	-	-	0,00
11			DIVERSOS									0,00



11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2,90	77,00			0,00	223,30	-	-	0,00
11.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	m²	545,92	4,50			0,00	2.456,64	-	-	0,00
										R\$ 109.310,12	R\$ -	R\$ 48.618,93	R\$ 48.618,93



Documento assinado digitalmente
SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA
Data: 01/10/2025 08:02:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUSTAVO DE GUSTAVO DE
ARAUJO ARAUJO
LIMA:11626685
2025.10.01
479 23:23:51-03'00"


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VELATORIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SERRA SECA, MUNICIPIO DE VERTENTES-PE

LOCAL: SERRA SECA - VERTENTES-PE

DATA: 30/09/2025

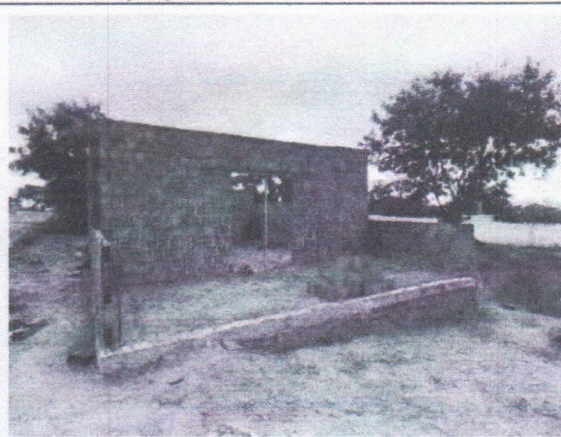


FOTO 1: EXECUÇÃO DO VELATÓRIO;



FOTO 2: EXECUÇÃO DO VELATÓRIO;

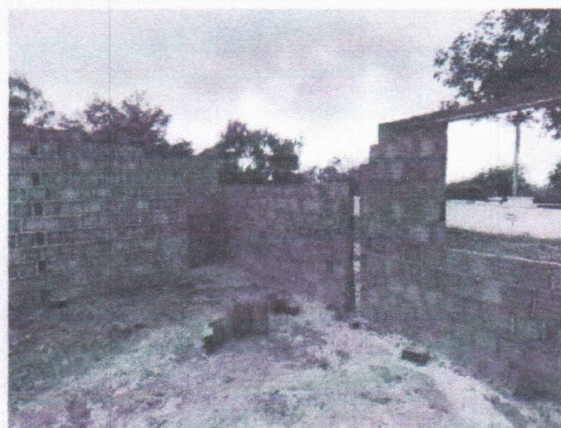


FOTO 3: EXECUÇÃO DO VELATÓRIO;

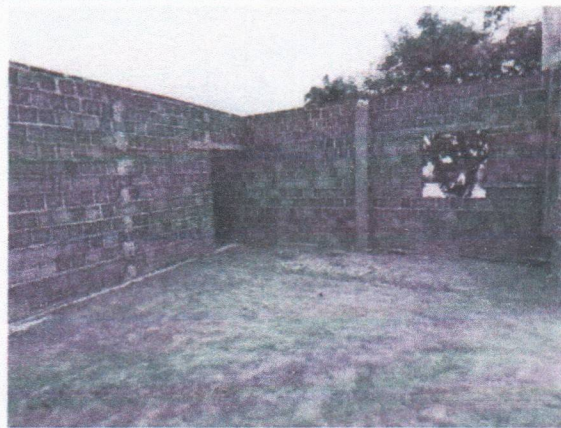


FOTO 4: EXECUÇÃO DO VELATÓRIO;



FOTO 5: EXECUÇÃO DO VELATÓRIO;



FOTO 6: EXECUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA;

Gertúlio Pinoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 116266
85479
GUSTAVO DE ARAUJO
LIMA: 11626685479
2025.10.01
23:25:48-03'00"

gov.br

Documento assinado digitalmente
SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA
Data: 01/10/2025 08:02:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
