



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 074/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	58,30	5,97		2,86	2,86	348,07	-	166,75
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M2	87,43	6,16		-	-	538,54	-	-
2.0	ESTRUTURA									
2.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020_PA	M2	232,47	29,74		-	-	6.913,58	-	-
2.2	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2.306,31	7,05		-	-	16.259,48	-	-
3.0	ALVENARIA									
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	85,52	24,92		24,92	24,92	2.131,27	-	2.131,27
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,81	57,42		-	-	5.386,61	-	-
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	144,57	2,77		2,77	2,77	400,45	-	400,45
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES									
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	4,75	137,75		0,80	0,80	654,13	-	3,79
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	41,98	137,75		0,80	0,80	5.782,05	-	33,58

Gertulio Timoteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.264-17
Portaria Nº: 09/1/2024

CNPJ 10.256.987/0001-60
81 95814-4011
81 9500-0189
gabinete@vertentes.pe.gov.br
Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CPF 55.770-000 | Control | Vertentes-PE

HPS - Construtora LTDA
Sociedade Limitada
Sociedade Administradora
CPF - 11.969.674/0001-44

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
ROR PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍLIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	73,90	51,80		4,52	4,52	3.827,78	-	334,00
										334,00

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. do Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

HPS - Construtora LTDA
Suelen Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.005.074-44

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO N° 07/4/2025 - PROCESSO LICITATORIO N° 017/2025 - DISPENSA N° 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO N°										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
5.0	REVESTIMENTO PISO									
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	34,51	28,60				987,06		
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	61,70	28,60				1 764 52		
6.0	REVESTIMENTO TETO									
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	47 63	28,60				1 362 28		
6.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	17 04	28,60				487 46		
7.0	PINTURA									
7.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10 62	506,22			389,68	5,378 07	4 139,95	4 139 95

Gerônimo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima
Sócio Administrador
CPF - 113.602.024-44

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA PE - 181907982-1

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.

PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO
8.0	TELHADO									
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROSE TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	88,11	28,50				2.519,80		
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,52	28,50				1.730,91		
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	86,12	6,00				516,71		
9.0	ESQUADRIAS									
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	373,26	3,00		2,00	2,00	1.119,76		746,51
9.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	783,98	0,40		0,40	0,40	313,59		313,59
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
10.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO Ø 3/4"	PT	55,42	3,00				166,26		
10.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERAMENTO	PT	272,67	25,00		19,00	19,00	6.816,85		5.180,80
10.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	330,81	4,00		1,00	1,00	1.323,23		330,80
10.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2024	UN	38,95	9,00		2,00	2,00	350,51		77,89

Geraldo Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 058.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.256.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

HPS - Construtora LTDA
Rua General F. da Silva
366A - Administração
CNPJ - 11.130.024-14

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
RCA nº 18107982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.520.477/00017-05
LOCAL: RUA DR. EMÍLIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.


CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
11.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	368,29	1,00		1,00	1,00	368,28	-	368,28	368,28
11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	554,81	3,00		1,00	1,00	1.664,42	-	554,80	554,80
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	315,13	2,00		2,00	2,00	630,26	-	630,26	630,26
11.4	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	140,22	6,00		-	-	841,31	-	-	-
11.5	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	142,56	2,00		-	-	285,11	-	-	-
11.6	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR.	UN	120,36	2,00		-	-	240,72	-	-	-
Valor do Boletim: QUINZE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS								71.109,08	-	15.412,72	15.412,72

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 051/2024

CNPJ 10.256.582/0001-50 61 59014-4081 61 5900-0189 Gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA PE - 181907982-1



MEMÓRIA DE CALCULO			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01			
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.						
LOCAL: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTE, Nº 97, CENTRO, VERTENTES-PE						
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº						
VERTENTES, 16 DE ABRIL DE 2025.						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3				
	ABERTURA DE PORTA - SECRETARIA DE OBRAS		0.80	0.12	2.10	0.20
	ABERTURA - COZINHA		2.00	0.12	2.65	0.64
	ABERTURA - ASSISTENCIA SOCIAL		0.80	0.12	2.10	0.20
	ABERTURA - SALA DE ESPORTES		1.00	0.12	2.10	0.25
	ABERTURA - SALA DE ESPORTES		0.80	0.12	2.10	0.20
	ABERTURA - SALA PEDAGOGICA		4.10	0.10	2.65	1.09
	ABERTURA - SALA MERENDA		0.80	0.12	2.10	0.20
	ABERTURA - SALA TRANSPORTES		0.85	0.10	0.50	0.09
					TOTAL:	2.86
3.0	ALVENARIA					
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM [ESPESSURA 10CM], AF_05/2020	M2				
	FECHAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS		0.80	2.10		1.68
	FECHAMENTO - COZINHA		0.80	2.10		1.68
	FECHAMENTO - COZINHA		2.60	2.65		6.89
	FECHAMENTO - COZINHA		0.80	0.60		0.48
	FECHAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL		0.80	2.10		1.68
	FECHAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL		0.85	1.30		2.21
	FECHAMENTO - SALA ESPORTES		0.80	2.10		1.68
	FECHAMENTO - SALA ESPORTES		0.85	1.30		1.11

Gerônimo Timoteo Bezerra
Eng. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ
10.296.887/0001-60

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Vertentes-PE
Sistema: Oliveira R. da Silva
Socia Administradora
CPF - 113.608.074-34

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1

	FECHAMENTO - PROCURADORIA		0.80	2.10		1.68
	FECHAMENTO - SALA PEDAGOGICA		0.80	2.10		1.68
	FECHAMENTO - ESTOQUE MERENDA		1.60	2.60		4.16
					TOTAL:	24.92
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2				
	SECRETARIA DE OBRAS		1.10	0.22		0.24
	FARMACIA		0.50	0.80		0.40
	FARMACIA		2.20	0.20		0.44
	COZINHA			0.80	0.53	1.70
					TOTAL:	2.77
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES					
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 10/2022	M2				
	FARMACIA		0.80	0.50		0.80
					TOTAL:	0.80
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², F= 17.5MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	M2				
	FARMACIA		0.80	0.50		0.80
					TOTAL:	0.80
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	M2				
	SECRETARIA DE OBRAS		0.90	0.33		0.30
	SECRETARIA DE OBRAS		0.90	0.22		0.20
	SECRETARIA DE OBRAS		0.33	0.22		0.15
	FARMACIA		0.40	0.30		0.12
	FARMACIA		0.40	0.20		0.16
	FARMACIA		3.00	0.20		0.60
	FARMACIA		1.50	2.00		3.00
					TOTAL:	4.52

Gertúlio Timóteo Bezerra
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 10.296.887/0001-60 81 98814-4011 81 9800-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

HPS - Construtora LTDA
Sociedade P. da Silva
Socia Administradora
CPF - 11.606.004-44

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil

7.0	PINTURA								
7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF. 04/2023	M2							
	SECRETARIA DE OBRAS [(4,25+1,35+1,15+1,66+3,13+3,23)*2,65]		14,97			2,65			39,67
	FARMÁCIA		0,80	0,50			2,00		0,80
	COZINHA (3,6+4,08)*2,1		7,68	1,00			2,00		15,36
	CORREDOR		16,70	2,65					44,26
	DESCONTO COZINHA (0,8*2,10*7)		0,80	2,10			(7,00)		(11,76)
	DESCONTO COZINHA (0,8*1,20*1)		0,80	1,20			(1,00)		(0,96)
	ASSISTENCIA SOCIAL (4,15+4,08)*2,65		8,23	2,65			2,00		43,62
	DESCONTO ASSISTENCIA (DESCONTO 0,8*2,10)		0,80	(2,10)					(1,68)
	SALA DE ESPORTES (3,3+4,1)*2,63*2		7,40	2,63			2,00		38,92
	DESCONTO SALA ESPORTES		0,80	2,10			(2,00)		(3,36)
	PROCURADORIA [(3,3+3,4)*2*2,65]		6,70	2,65			2,00		35,51
	DESCONTO PROCURADORIA		0,80	(2,10)					(1,68)
	DESCONTO PROCURADORIA		0,80	(1,20)					(0,96)
	SALA PEDAGOGICA [(6,56+4,07)*2*2,5]		10,63	2,50			2,00		53,15
	DESCONTO SALA PEDAGOGICA		0,80	(2,10)					(1,68)
	SALA TRANSPORTES [(4,10+3,5)*2*1]		7,60	1,00			2,00		15,20
	DESCONTO SALA TRANSPORTES		0,80	(1,00)					(0,80)
	DESCONTO SALA TRANSPORTES		1,20	(0,50)					(0,60)
	SALA MERENDA [(3,8+4,10)*2*2,65]		7,90	2,65			2,00		41,87
	DESCONTO SALA MERENDA		(0,80)	2,10			2,00		(3,36)
	DESCONTO SALA MERENDA		0,85	(1,30)					(1,11)
	ESTOQUE MERENDA [(7,50+1,60)*2*2,6]		9,10	2,60			2,00		47,32
	DESCONTO ESTOQUE MERENDA		0,80	(2,10)					(1,68)
	FACHADA		6,10			3,00			18,30
	FACHADA		5,00			3,00			15,00
	FACHADA		5,95			3,00			17,85
	FACHADA		2,70			3,00			8,10

Gertulio Timoteo Bezerra Nº 10.296.887/0001-60
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

gabinete@vertentes.pe.gov.br
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Dr. Emidio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araujo Lima
Engenheiro Civil
CREA PE - 181907982-1


	DESCONTO JANELAS DA FACHADA (1.17*0.96*8UND)		1,17	0,98	(8,00)	(9,17)
	DESCONTO PORIAS DA FACHADA (1.00*2,15*3UND)		1,00	2,15	(3,00)	(6,45)
					TOTAL:	389,68
9.0	ESQUADRIAS					
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN				
	SECRETARIA DE OBRAS				2,00	2,00
					TOTAL:	2,00
9.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2				
	BASCULANTE FARMÁCIA		0,80	0,50		0,40
					TOTAL:	0,40
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" - FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT				
	COZINHA				4,00	4,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				4,00	4,00
	PROCURADORIA				2,00	2,00
	TRANSPORTES				3,00	3,00
	MERENDA				3,00	3,00
	ESTOQUE MERENDA				3,00	3,00
					TOTAL:	19,00
10.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT				
	SALA PEDAGÓGICA				1,00	1,00
					TOTAL:	1,00
10.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN				
	PROCURADORIA				2,00	2,00

Gertúlio Amoteco Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
CNPJ 08.985.284/77
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

81 99814-4011 81 9500-0189 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA PE - 181907982-1

Vertentes LTDA
Rua da Silva
Cidade de Vertentes-PE
CEP 55.770-000

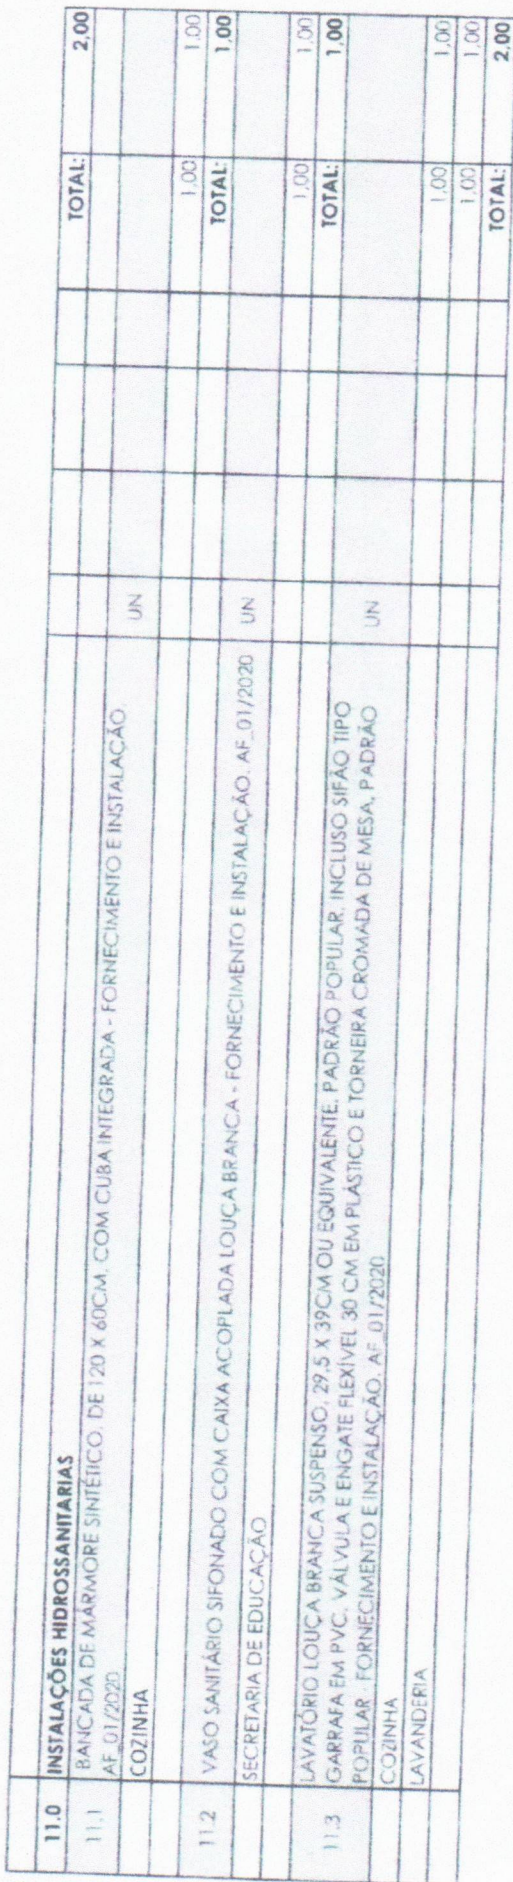

Gertulio Timoteo Bezerra
 Setor de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo Lima

CNPJ
10.296.887/0001-60

Engenheiro Civil
CREA/PE 181907982-1



Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

gabinete@vertentes.pe.gov.br

01 99814-4011
01 9500-0189

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 01

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES.
CONTRATO Nº 074/2025 PROCESSO LICITATÓRIOPNº 017/2025 - DISPENSA Nº 017/2025

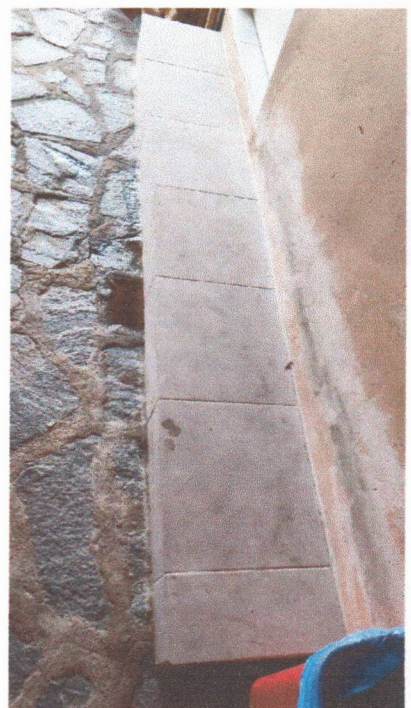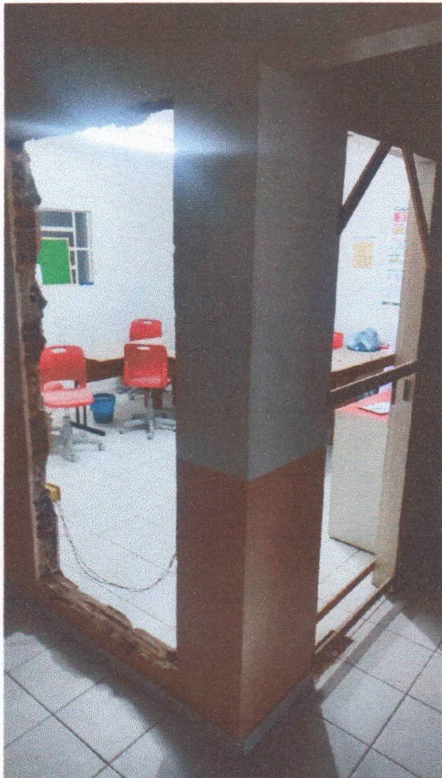


Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.986.284-77
Portaria Nº: 091/2024
